


BILAN

Ecole Bénézet



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



2025

01

SYNETHIC

Expertises, innovations

02

LIFE WASTE2BUILD

Equipe, objectifs, actions

03

L'OPÉRATION

Ecole Bénézet



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

NOS EXPERTISES

Appuyer la montée en compétences des acheteurs publics dans l'introduction du développement durable dans leurs marchés.



**LES ACHATS
PUBLICS
DURABLES :
RES'OCC**



**L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
DANS LE
BTP**



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

Le Guichet de l'économie circulaire dans le BTP

Plateforme
d'accélération régionale
pour impulser et
massifier l'économie
circulaire dans le secteur
de l'aménagement et du
bâtiment en Occitanie

**ACHETEURS
PUBLICS / PRIVÉS**

Commande
de travaux

*Accompagnement
sur l'ensemble
de la démarche
Economie circulaire*

**FACILITATEUR
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE**

*Soutien et
contrôle*

ENTREPRISES BTP

Mise en œuvre des
matériaux
(ressources / déchets)

*Identification
des filières,
des gisements*

*Intégration de l'
économie
circulaire aux
prescriptions*

**MAÎTRISE
ŒUVRE**

Conception
circulaire,
mission déchets...

OPÉRATEURS

Collecte, stockage,
transformation et
valorisation des
matériaux



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

NOS INNOVATIONS

**Incubation et développement
de projets à impact positif et
accélérateurs de la transition
alimentaire**



**L'OPÉRATION
MENU 2 FOIS
BON DANS
LES CANTINES**



**LE TIERS-LIEU
NOURRICIER
EDENN À TOULOUSE
MÉTROPOLE**



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

Life Waste2Build

Optimiser les ressources et
valoriser les déchets du BTP
à l'échelle locale puis régionale

2021-2026



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

L'ÉQUIPE COORDINATRICE

PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES



Budget : 2 757 841 €
Cofinancement européen : 55%

toulouse
métropole



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS

- Réduire de 20% l'impact du BTP dans la consommation de ressources et la production de déchets
- Structurer la filière du BTP circulaire
- Mettre en place des politiques d'achats plus circulaires
- Accompagner la montée en compétence de la filière du BTP circulaire

DE RÉSULTATS

- 85% de déchets revalorisés sur la métropole toulousaine
- 80% des marchés publics de la métropole qui intègrent un critère économie circulaire
- 60% des entreprises répondant aux marchés publics sensibilisé à ces enjeux
- 360 équivalents temps plein/an créés à partir de 2026

SYNTHÈSE DES ACTIONS OPÉRATIONNELLES

2021-2026



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



EXPÉRIMENTER ET MODÉLISER

- 58 chantiers exemplaires (dont 8 pilotes)
- Un kit marchés publics (32 fiches)
- Mutualisation Diagnostic ressources pour 17 donneurs d'ordre

FÉDÉRER ET MASSIFIER

- Signature d'une Charte économie circulaire BTP
- Création d'un guichet territorial : 60 donneurs d'ordre
- Elargir le périmètre auprès de 230 donneurs d'ordre régionaux et privés



OUTILLER ET FORMER

- Plateforme numérique
- Guide ressources de 55 Fiches
- Essaimage de 2 plateformes physiques
- Formation de 1300 entreprises et salariés
- 24 fiches métiers
- Formation de 80 maîtres d'œuvre

ÉVALUER COMMUNIQUER ET DISSÉMINER

- 10 territoires inventoriés et 200 acteurs Audités
- 14 indicateurs socio-éco et environnementaux
- 4000 scolaires et universitaires sensibilisés
- Tiny House 100% réemploi
- 6 webinaires européens
- 3 territoires et chantier sur DUSSELDORF



58 sur 58 chantiers exemplaires engagés



- Prescriptions économie circulaire
- Appui au suivi de chantier
- Boucles circulaires
- Contrôle d'exécution
- Bilan final d'opération

85 % de valorisation matière
des déchets exprimés en
tonnage

5% de matériaux de seconde
main exprimé en valeur
financière des fournitures

Les 8 premiers chantiers exemplaires :

Déconstruction Gluck
[Groupe des Chalets](#)

Nouveau Campus
[Toulouse Business School](#)

Déconstruction N°26 Menton
[Toulouse Métropole Habitat](#)

Déconstruction gymnase – ZAC Empalot
[Oppideu](#)

Réfection Lycée Bellevue
[La Région Occitanie](#)

Réhabilitation groupe scolaire Benezet
[Maire de Toulouse](#)

Déchèterie Hall 9 - Ramier
[Syndicat Mixte Decoset](#)

Réhabilitation logement rue Denfert-Rochereau
[In'li Sud-Ouest](#)



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

MÉTHODOLOGIE DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT DES 58 CHANTIERS

Du programme au bilan : un coordinateur

1

Rédaction des marchés
diagnostiqueur PEMD et sélection
du diagnostiqueur

2

Analyse du diagnostic

3

Participation à la rédaction
des marchés MOE

4

Etude circulaire des
propositions MOE

5

Enquête et appui MOA : recherche
de destinations site et hors-site,
anticipation des cessions, recherche
de fourniture (Sourcing),
identification de gisements et
filières, boucles inter-chantiers...

6

Participation à la rédaction
des marchés travaux

7

Analyse des offres travaux

8

Mission ressources et déchets :
- suivi hebdomadaire pour les 8
chantiers pilotes
- suivi mensuel en lien avec l'équipe
de MOE / BE dédiée pour les 50
autres chantiers

9

Consolidation : bilan
environnemental, emploi et
économique




LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



Rédaction du marché: expertise et intégration économie circulaire



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



- 1** Objectifs : optimisation de la valorisation
- 2** Prescriptions économie circulaire et gestion des ressources :
 - dépose sélective
 - hiérarchie des modes de traitement
 - caractérisation des déchets
- 3** Critères économie circulaire :
 - taux de valorisation matière visé
- 4** Schéma d'Organisation de la Gestion et de l'Élimination des Déchets de chantier (SOGED)
- 5** Responsable Environnement Entreprise (REE)
- 6** Traçabilité des déchets
- 7** Bilan économie circulaire de fin de chantier

Assistance à maîtrise d'ouvrage économie circulaire :



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

ÉTAPES	PROJET 1 Rénovation	PROJET 2 Déconstruction	PROJET 3 Aménagement	PROJET 4 Construction Bâtiment
1 CONCEPTION	Rédaction de projet de concours	Analyse de projets	Rédaction de projet de concours	Rédaction de projet de concours
	Prescription diagnostic ressources (dont BIM)	Enquête	Analyse des projets d'aménagements	Analyse des projets architecturaux
2 PRÉPARATION	Rédaction des marchés travaux	Rédaction des marchés travaux	Rédaction des marchés travaux	Rédaction des marchés travaux
	Analyse des offres	Analyse des offres	Analyse des offres	Analyse des offres
3 SUIVI	Mission ressources / déchets : sourcing acquéreur, suivi, sensibilisation	Mission ressources / déchets	Mission ressources / déchets	Mission ressources / déchets
	Consolidation données	Consolidation données	Consolidation données	Consolidation données

Le projet de restructuration du groupe scolaire Bénézet à Toulouse a débuté par une déconstruction sélective de l'existant, suivie de la construction d'un nouveau bâtiment en R+1, combinant un socle béton et une ossature bois. Le bâtiment accueille des espaces d'enseignement, une bibliothèque, un restaurant scolaire, des locaux administratifs et des espaces CLAE. La démarche économie circulaire s'est traduite par un parti pris de sobriété architecturale, l'intégration de matériaux issus du réemploi, et une conception bioclimatique (ventilation naturelle, protections solaires, îlots de fraîcheur). Le niveau de performance visé (E3C1) a été atteint grâce à une pompe à chaleur géothermique et 68 kWc de photovoltaïque en toiture.

Libellé de l'opération
Ecole BENEZET
Adresse
37 Rue Bernard Bénézet, 31 300 TOULOUSE
Maître d'Ouvrage
Ville de Toulouse
Période
De juillet 2023 à septembre 2025
Nature de l'opération
Déconstruction + Reconstruction
Référent MOA
Walter Corrocher
Référents SYNETHIC
Olivier Françoise
Equipe MOE
C+2B Architecture


LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

les ambitions du projet



Objectifs stratégiques

- **85% de valorisation globale matière** des ressources et déchets (soit + 15 points relativement à la réglementation) pour l'ensemble des travaux (déconstruction, rénovation et extension)
- **5% des matériaux** utilisés dans les cadre des travaux d'extension/ rénovation seront **issus du réemploi ou recyclés**



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

les éléments clefs du projet



Un chantier exemplaire

Réutilisation des menuiseries extérieures dans les murs à ossature bois

Réemploi du parquet pour créer du mobilier (banque d'accueil, bancs, tablettes)

Optimisation du projet avec traitement des sols à la chaux, évitant l'apport de ressources

Transformation des ouvrages perdus de chantier en mobilier extérieur

Utilisation de stocks dormants pour les faïences et bardages

Financement des pratiques et métiers locaux de l'économie circulaire



A noter une mission dédiée réemploi pour le bureau de contrôle



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

établissement du marché

Une typologie du réemploi en trois catégories définies par Synéthic :

- Réemploi in situ non sensible
ceci touche les **matériaux présents sur site** dont la dépose et le stockage sur site sont **assurés par l'entreprise de déconstruction**. L'**entreprise titulaire du lot concerné** par le matériau **repose le matériau après reconditionnement sur site**.
- Réemploi in situ sensible
l'entreprise titulaire du lot concerné par le matériau considéré comme sensible doit **effectuer une dépose soignée**, le transporter **hors du chantier pour le reconditionner** et le stocker avant de le poser.
- Réemploi ex situ
l'entreprise titulaire du lot concerné se fournit en matériau en **s'appuyant sur les filières existantes**. Elle prend en charge le transport et le reconditionnement avant la pose.



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

déconstruction + déchets de construction

Poids total de ressources
déconstruites :

672,6 t

Poids total de déchets de
construction :

114,7 t

Poids total :
787,3 t

=

16,1 t
réemploi

744,8 t
matière valorisée

26,4 t
matière non valorisée

soit **96.6%** de **valorisation** de la production de déchet (objectif cible 85%)


205 tonnes valorisées au delà des 70% réglementaires prévus par la loi LTECV



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées

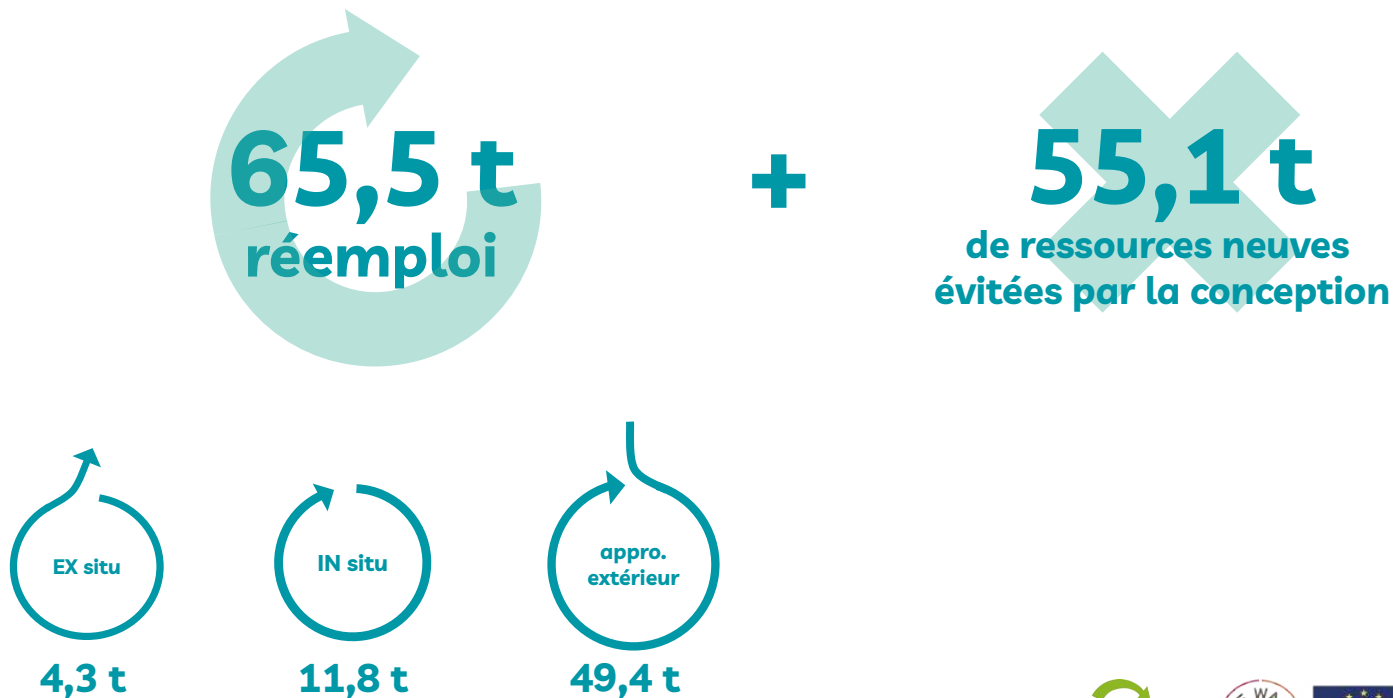

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

déconstruction - ressources réemployés ex situ



4,3 t

porte intérieure - bois, lavabo, chemins de câble métalliques, faux plafonds laine de bois, parquet traditionnel, urinoir, poutre bois
→ **récupération par des structures locales**



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées ex situ

BOUCLE EX SITU : 80 m²

Réemploi sur la Tiny House témoin
du projet LifeWaste2Build



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées ex situ

BOUCLE EX SITU : 20 m²

Conception et fabrication d'un projet
individuel de mezzanine




LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



© crédit photo : 3.14 Conception

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées in situ



11,8 t

chaperon terre cuite, bancs béton, racks à vélo, urinoir, menuiseries ext aluminium, murale, vitrine, radiateur fonte, lavabo, portail
upcycling : banque d'accueil, banc bois, tablette



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

upcycling de ressources in situ

BOUCLE IN SITU : 150 kg


Fabrication de la **banque d'accueil**,
des **tablettes**, et de **bancs en bois**
à partir du parquet d'origine,
par l'entreprise Antras



Intégration de cette prestation dans
le marché du Lot Menuiseries
Intérieures - Mobilier



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

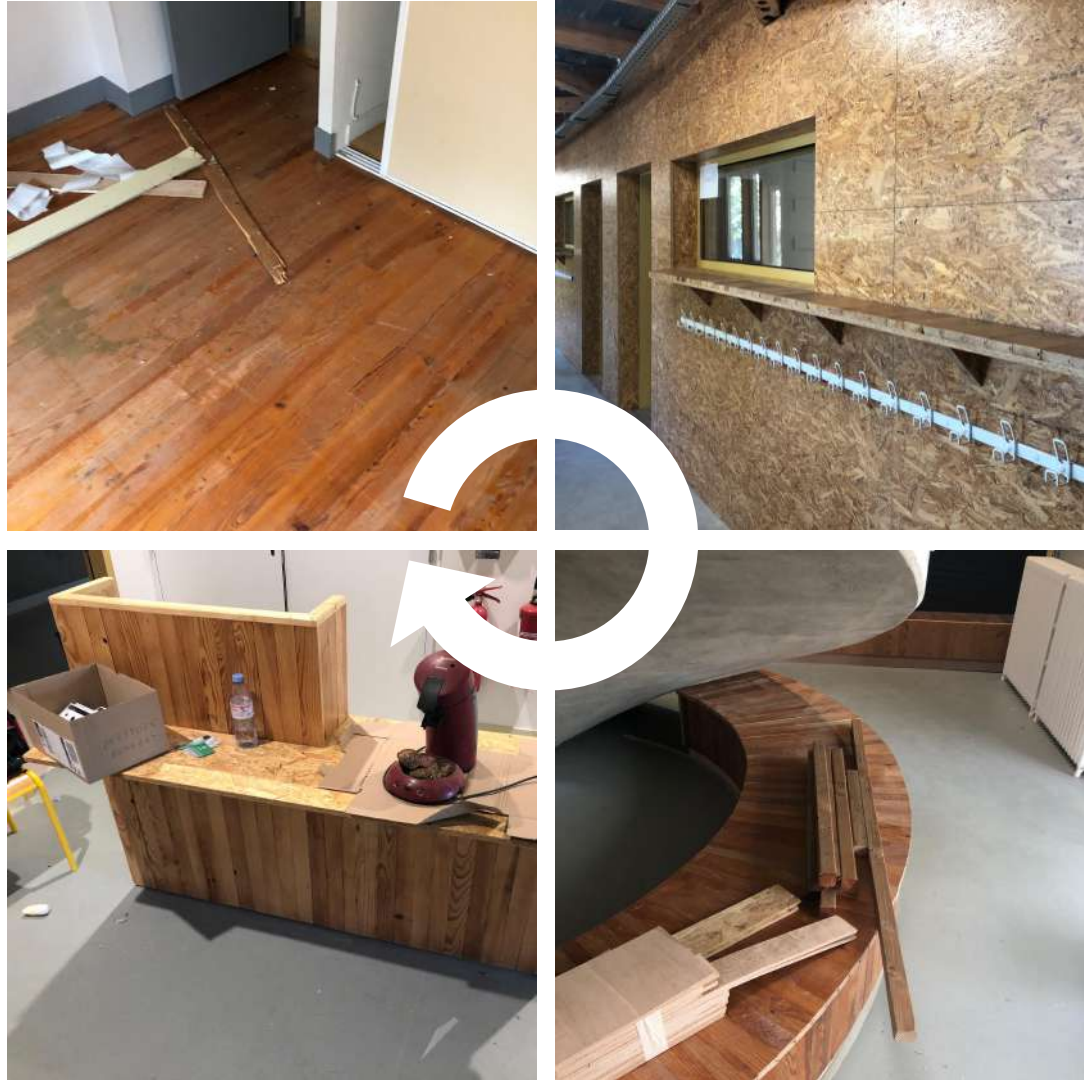

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE upcycling de ressources in situ

BOUCLE IN SITU : 2m3

Transformation des
ouvrages perdus de chantier en
banc pour la cour



Titulaire du lot gros oeuvre -
Initiative prise en cours de chantier



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

réemploi des menuiseries

BOUCLE IN SITU : 44 u



Entreprise titulaire du Lot
et en charge de la dépose soignée, du
reconditionnement et de la repose

SMAP




LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées in situ : les menuiseries extérieures



1. Retrait des joints et des parcloles pour accéder au vitrage

2. Retrait du vitrage à l'aide de ventouses

3. Dépose des habillages extérieurs à l'aide d'un cutter ou d'une scie sabre

4. Retrait des fixations intérieures du châssis

7. Mise en palette et transport vers l'atelier SMAP

6. Retrait des habillages intérieurs

5. Dépose du châssis par l'intérieur

8. Reconditionnement : drainage et resserrage des angles

9. Transport vers le site de rénovation

10. Repose des menuiseries reconditionnées




Entreprise titulaire du Lot et en charge de la dépose soignée, reconditionnement et repose tels que décrits dans le CCTP



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées in situ : les menuiseries extérieures



Une approche limitant les risques :

- La **typologie** des menuiseries sélectionnées pour le réemploi : les **châssis réemployés sont fixes**. Ceci limite les risques dans la mesure où les modalités d'usage passées et futures sont connues (elles n'ont pas subies et ne subiront pas des ouvertures et fermetures répétées)
- Les **spécifications imposées par le maître d'ouvrage dans son cahier des charges** : le titulaire du lot « Menuiseries extérieures aluminium » devait prendre en charge la dépose et la pose des menuiseries extérieures de réemploi.
- Des **exigences d'usage diminuées** : les prescriptions de la réglementation thermique actuelle aurait écarté le réemploi de ses menuiseries dans des zones requérant une isolation thermique (par exemple des salles de classe). Pour cette opération le maître d'ouvrage a indiqué que les zones de réemploi concerneraient des coursives. Ce lieu de passage n'impose pas le respect de la réglementation thermique. Les menuiseries remplissent **uniquement une fonction d'éclairage naturelle** de la coursive.
- L'entreprise a récupéré quelques **menuiseries supplémentaires afin de faire face aux aléas** de chantier.
- Le **marché lié au réemploi reste limité dans son ampleur**. Il représente pour la SMAP 8% du montant total alloué à ce lot 5 (45 châssis ont été réemployés). Le reste du lot porte sur la fourniture et pose de menuiseries neuves.




LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ressources réemployées in situ : les menuiseries extérieures

bonnes pratiques liées à l'assurance :



Le réemploi de menuiseries extérieures est peu courant et rarement possible en raison des évolutions de la réglementation thermique et des progrès technologiques enregistrés sur les produits neufs. Dans le cas du projet Bénézet, **plusieurs éléments contribuent à la mise en application de la garantie décennale :**


- Un processus de reconditionnement maîtrisé : l'entreprise de menuiserie aluminium et métallique est **qualifiée et expérimentée**. Ceci lui permet d'avoir une maîtrise complète du processus de la dépose à la repose. Cette maîtrise l'amène à porter le risque et à garantir les fenêtres en décennale.
- Un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) cohérent avec les objectifs de réemploi : le maître d'ouvrage a considéré que pour maîtriser les risques il fallait confier le marché de **dépose soignée à l'entreprise qui serait aussi chargée du reconditionnement et de la repose**.
- Une garantie décennale liée à l'usage : l'entreprise a joué le rôle de qualificateur et elle porte le risque en décennale uniquement parce que les conditions d'usage des menuiseries extérieures aluminium de réemploi le permettent. Les **châssis étaient et resteront fixes** et **aucun objectif de performance thermique n'est recherché**.



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

approvisionnement en réemploi / stock dormant

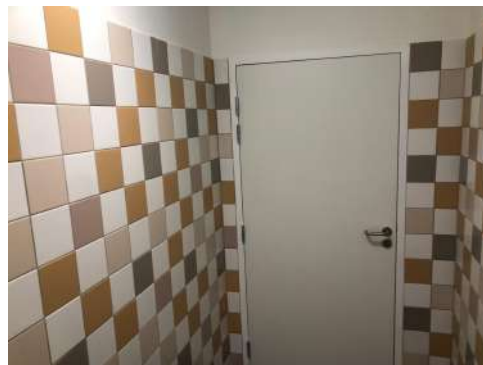

panachage des carreaux
avec l'entreprise titulaire et
les architectes

TECHNI CERAM



bardage issu de
déclassé ou stock
dormant



49,4 t

moquette, chemin de câble, bardage bois, bac acier,
carrelage faïence et sol



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet environnemental



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

VOLET ENVIRONNEMENT				
Valorisation matière et recyclage	Réemploi	Boucles de réemploi	Economie de ressource	Economies carbone réemploi
204,96 t de déchets valorisés en plus des obligations légales	65,4 t de ressources réemployées : sauvés de la benne et production évitée	26 boucles réalisées	55 t d'utilisation de gravier évitées	49,8 tonnes eq CO2 évitées par le réemploi
96,57% de taux de valorisation matière des déchets du chantier au lieu de 70% imposés par la loi	soit une économie équivalente à la production annuelle de déchets ménagers de 142 habitants	chaperon terre cuite, banc béton, racks à vélo, urinoir, menuiseries ext aluminium, banque d'accueil, banc bois, vitrine, tablette murale, radiateur fonte, portails, lavabo, moquette, chemins de câble métalliques, bardage bois, bac acier, carrelage, bac de plonge, porte intérieure, faux plafonds - minéral, parquet traditionnel, urinoir, poutre bois	soit 500m3 ou l'équivalent d'une piscine de 25x10m	soit 24 personnes faisant l'aller-retour Paris-New York en avion

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet emploi



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

	Ingénierie	Dépose	Reconditionnement	TOTAL (h)
STTL Déconstruction		350		350
LOT 02 GO - Crespy			40	40
LOT 03 bardage - Antras	10			10
LOT 4 étanchéité - Sobra	5			5
LOT 5 MEX - SMAP		136	8	144
LOT 9 MIN - Antras			50	50
LOT 11 sols durs - Techni Ceram	40			40
LOT 13 CFO/CFA - Allez 1 Cie	5			5
LOT 15 CVC - MGC	8			8
TOTAL (h)	68	486	98	652

TOTAL JOURS	93	de travail supplémentaire créés
	0,406	ETP-an créés (1607h/ETP)
<i>Impact économique estimé : 35€/h</i>	22 820 €	HT de gains économiques liés à la création d'emploi

VOLET EMPLOI

Création d'emploi

93 jour-personne
d'emplois créés

0,4 ETP-an
créés (1607h/ETP)

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet financier - réemploi EX situ



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

PEM	Unité	Quantité	Poids total (t)	Prix déchet évité :	structure acquéreuse	Coût de dépose : dépense MOA	Bilan financier MOA : déchet évité + revente - coût dépose	Prix à neuf (€/UF)	Total achat neuf évité (€) (Prix à Neuf - Prix achat 2nde main)
Porte intérieure - bois	U	2	0,06	7 €	3,14 conception		7 €	60 €	120 €
Lavabo	U	1	0,04	1 €	La chapelle		1 €	45 €	45 €
Chemins de câble métalliques	ml	6	0,01		La chapelle	175 €	-175 €	22 €	132 €
Faux plafonds - laine de bois	m²	80	0,80	180 €	3,14 conception	530 €	-350 €	70 €	5600 €
Parquet traditionnel	m²	20	0,24	26 €	3,14 conception	800 €	-774 €	40 €	800 €
Urinoir	U	1	0,03	1 €	La chapelle		1 €	60 €	60 €
Poutre bois - bastaing	m3	7	3,08	339 €	STTL		339 €	500 €	3500 €
Totaux			4,3	554 €	3	1 505 €	-951		10 257 €

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet financier - réemploi IN situ



LE PROJET LIFE WASTE BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

PEM	Unité	Quantité	Poids total (T)	Prix déchet évité(€) : économie MOA	Prix à neuf évité total(€)	Coût traitement pour réemploi ; dépense MOA (dépose soignée, caractérisation...)	Bilan financier MOA : déchet évité + achat neuf évité - coût traitement
Chaperon terre cuite	ml	15	0,20	6 €	150 €	140 €	16 €
Banc béton	m3	2	4,60	129 €	100 €		229 €
Racks à vélo	U	11	0,11		1980 €		1980 €
Urinoir	U	2	0,06	2 €	350 €	84 €	268 €
Menuiseries ext Aluminium	m²	44	2,79	627 €	19096 €	4266 €	15457 €
Upcycling : Banque d'accueil	U	1	0,02	3 €	2673 €	2602 €	73 €
Upcycling : Banc bois	U	1	0,06	7 €	1092 €	974 €	125 €
Vitrine	U	4	0,02	5 €	2739 €	630 €	2113 €
Upcycling : Tablette murale	U	52	0,06	7 €	2548 €	3619 €	-1064 €
radiateur fonte	U	28	2,80	1000 €	14000 €	10794 €	4206 €
Portails	U	1	1,00		4800 €		4800 €
Vasque - Lavabo	U	2	0,08	2 €	1155 €	1182 €	-25 €
Totaux			11,80	1 786 €	50 684 €	24 291 €	28 178 €

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet financier - approvisionnement



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

PEM	Unité	Quantité	Poids total (t)	Prix d'achat total (€) 2nde main (A)	Prix à neuf total (€) évité (B)	Bilan financier (€) MOA (B) - (A) = (C)
Moquette	m²	54	0,25	1620 €	2771 €	1151 €
Chemins de câble métalliques	ml	60	0,10	300 €	1320 €	1020 €
Bardage bois	m²	238	2,07	4760 €	9520 €	4760 €
Bardage bois	m²	1002	8,72	36072 €	40080 €	4008 €
Bac acier	m²	20	0,20	1000 €	700 €	-300 €
Carrelage faïence	m²	832	27,21	15309 €	15309 €	
Carrelage sol	m²	333	10,88	6030 €	6656 €	626 €
Bac de plonge	U	1	0,02	2500 €	2500 €	
Totaux			49,45 t	67 591 €	78 856 €	11 265 €

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet financier - économie de ressource



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

PEM	Unité	Quantité	Poids total (T)	Prix à neuf total (€)évité	Bilan financier (€) MOA achat neuf évité - coût traitement
Gravillons remplacés par traitement à la chaux	m3	500	55,15	7500 €	7500 €
Totaux			55,15	7 500 €	7 500 €

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet financier / GLOBAL



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

VOLET ECONOMIQUE				
Impacts économiques directs		Bilan global	Objectifs	Externalités économiques
93 387 € réinjectés dans les pratiques et métiers de l'économie circulaire (dépose soignée, reconditionnement, achat 2nde main)	2 337 € économies liées à l'évitement de déchet par le réemploi	0,80 % d'économie pour la MOA	Objectif cible : 5 % du montant total des produits, équipements, matériaux mis en œuvre sur le projet (hors taxes) consacré à l'achat de produits équipements matériaux issus du réemploi. soit 143 012 €	22 820 € de gains économiques liées à la création d'emploi
			Objectif atteint : 125 705 € soit 88% de l'objectif fixé, c'est à dire 4,4% du montant total de fourniture	
45 087 € d'économie sur achat neuf évité par la fourniture en réemploi ou les stratégies d'économie de ressource	45 919 € d'économie au total pour la MOA	sur 5 720 500 € de marché total de travaux		3 473 € de gains économiques liées aux économies d'émission de CO2

BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Volet financier / atteinte des objectifs par lot



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

Lot du projet	Total réemploi par lot	Somme in situ	Somme appro	Somme économie ressource	Montant total lot	Pourcentage atteint dans le lot
LOT 02 GO	7 680 €	180 €	0 €	7 500 €	1 839 507 €	0,42%
LOT 03 CHARPENTE BOIS MOB BARDAGE	41 832 €	0 €	41 832 €	0 €	377 618 €	11,08%
LOT 04 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE	0 €	0 €	0 €	0 €	265 771 €	0,00%
LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	19 096 €	19 096 €	0 €	0 €	428 253 €	4,46%
LOT 06 - SERRURERIE	6 780 €	6 780 €	0 €	0 €	241 228 €	2,81%
LOT 07 - ENDUITS SUR ITE	0 €	0 €	0 €	0 €	150 000 €	0,00%
LOT 08 - PLATRERIE	0 €	0 €	0 €	0 €	257 750 €	0,00%
LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER	9 052 €	9 052 €	0 €	0 €	267 141 €	3,39%
LOT 10 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET TEXTILES	1 620 €	0 €	1 620 €	0 €	69 442 €	2,33%
LOT 11 - REVETEMENTS DE SOLS DURS / FAÏENCES	21 339 €	0 €	21 339 €	0 €	143 931 €	14,83%
LOT 12 - PEINTURE	0 €	0 €	0 €	0 €	80 000 €	0,00%
LOT 13 - ELECTRICITE	300 €	0 €	300 €	0 €	395 000 €	0,08%
LOT 14 - PHOTOVOLTAIQUE	0 €	0 €	0 €	0 €	105 301 €	0,00%
Lot 15 CVC-PLB-EQUIPEMENTS SANITAIRES-GEOTHERMIE	15 505 €	15 505 €	0 €	0 €	955 027 €	1,62%
LOT 16 - CUISINE	2 500 €	0 €	2 500 €	0 €	122 287 €	2,04%
LOT 17 - ASCENSEUR	0 €	0 €	0 €	0 €	22 230 €	0,00%
Total	125 705 €	50 614 €	50 614 €	50 614 €	5 720 486 €	

RETOURS D'EXPÉRIENCES

CONDITIONS DE RÉUSSITE / IMPACTS

Forte implication des acteurs :

- MOA /MOE avec une mission EC, un temps dédié, contrôleur avec une mission d'avis technique réemploi

Processus maîtrisé :

- intégration dès la phase primaire de conception : concours/ APS + adaptabilité en phase opérationnelle
- Diagnostic PEMD complété par un diagnostic ressource par domaine d'emploi stabilisé
- Réunions de travail dédiées pour valider les boucles et les stratégies de prescriptions (réemploi sensible, allotissement)
- Utilisation d'un outil unique (PV de réemploi) partagé

De nombreuses boucles complexes réussies :

- Dont le réemploi in situ des 44 menuiseries extérieures via une qualification en cascade

Des impacts vertueux : près de 5% de réemploi avec des gains économiques à la clé !

LIMITES ET FREINS

Synchronisation délicate des temporalités :

- emprise de stockage temporaire limité
- lot infructueux entraînant des changements de stratégie de dépose pour optimiser les calendriers
- difficulté de projection sur des ressources à conserver 12 à 24 mois avant la réalisation concrète d'intégration

Acculturation inégale des objectifs visés :

Si de nombreux corps d'état se sont emparés du sujet, certains lots n'ont pas pu contribuer à la dynamique Economie circulaire

Une opération phare du projet LIFE WASTE2BUILD confirmant l'atteinte d'objectifs ambitieux en générant des gains économiques !



LE PROJET LIFE WASTE2BUILD
A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME
LIFE DE L'UNION EUROPÉENNE

« NOS RESSOURCES
FONT NOS PROJETS »

Merci de votre attention
patrick@synethic.fr

